Musicalloo Planning

Inhoud

DOD & Buffers	2
Planning	
Gantt Chart	
Taken	
Weekplanning	E

DOD & Buffers

DOD (Definition of Done):

- Een onderdeel is pas klaar wanneer het goedgekeurd is door het team.
- Minstens 1 feedbackmoment waaraan alle teamleden deelnemen is vereist.

BUFFERS:

<u>Design</u>

- 1-2 dagen zijn voorzien voor elementen waarbij een buffer belangrijk is.


Development

- Wanneer er vertraging is bij het maken van de website wordt dit vanaf week 2 overgenomen door de PM.
- Indien het maken van het prototype langer duurt dan verwacht wordt dit samengevoegd met MLP en worden er 3 weken vrijgemaakt voor het eindproduct. Hiervoor is een aparte back-up planning opgesteld.

Planning

TASK NAME	START DAY	DURATION	BUFFER	HOURS
Design				
Website Wireframes	0	2	1	0
Website Design	1	4	1	0
Website Front-End	3	5	2	0
Branding	10	4	2	0
Style Guide	11	4	1	0
ux/ui	5	6	0	0
UX Testing	5	6	0	0
Fotografie & Fotobewerking	15	5	0	0
Storyboarding	15	2	1	0
Filmen	16	6	1	0
Editen	21	4	1	0
ux/ui	25	5	0	0
UX Testing	25	5	0	0
Development				
Website Back-End	0	5	0	0
Schetsen	5	1	0	0
Prototype Hardware	5	5	0	0
Prototype Code	5	5	0	0
Prototype Testing	5	5	0	0
MLP Hardware	10	10	0	0
MLP Code	10	10	0	0
MLP Testing	10	10	0	0
Eindproduct Hardware	20	10	0	0
Eindproduct Code	20	10	0	0
Eindproduct Testing	20	10	0	0
Davalanment Rack Un Plan				
Development Back-Up Plan Website Back-End	0	5	0	0
Schetsen	5	1	0	0
MLP Hardware	5	10	0	0
MLP Code	5	10	0	0
MLP Code MLP Testing	5	10	0	0
9			0	0
Eindproduct Hardware	15	15	-	
Eindproduct Code	15	15	0	0
Eindproduct Testing	15	15	0	0

Gantt Chart

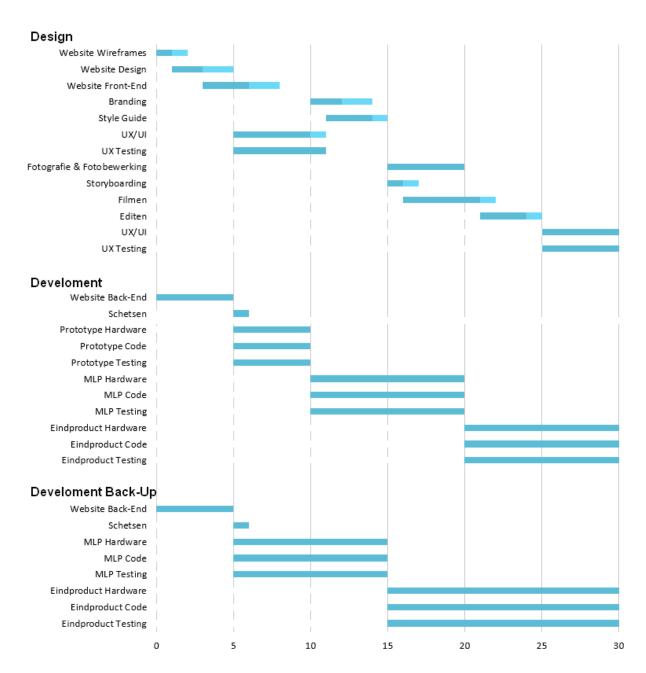

(De lichtere blauwe delen in de Design planning duiden de buffertijden aan)

Taken

PROJECT MANAGEMENT (24 uren/week, 144 uren totaal)

- Timesheets, briefen, plannen, controle, communicatie, sociale media, ...
- Joker (vrij in te zetten waar nodig)

DESIGN (24 uren/week, 144 uren totaal)

- Website wireframes
- Website design
- Website front-end
- Branding
- Style guide
- UX/UI
- UX Testing
- Fotografie & fotobewerking
- Storyboarding
- Filmen
- Editen

DEVELOPMENT (48 uren/week, 288 uren totaal) [250 UREN PLANNEN, 48 UREN RESERVE]

- Schetsen
- Website back-end
- Prototype hardware
- Prototype code
- Prototype testen
- MLP: hardware
- MLP: code
- MLP: testing & debugging
- Eindproduct: hardware
- Eindproduct: code
- Testing & debugging

Weekplanning

WEEK 1 19/11 – 25/11

Brainstorm Concept

Wat: Brainstormen om ideëen voor het project te bedenken.

Wie: Dev, Des, PM Duur: 3,5u x 4 Kost: €560

TOTALE UREN = 14 TOTALE KOST = €560

WEEK 2 26/11 – 02/12

Project Concretiseren

Wat: Project selecteren, naam bedenken, schetsen, logische uitvoering bespreken

Wie: Dev, Des, PM

Duur: 5u x 4 Kost: €800

Planning & Budget & Timesheets

Wat: Planning opstellen, budget verdelen, timesheets opmaken

Wie: PM
Duur: 5u x 1
Kost: €200

TOTALE UREN = 25 TOTALE KOST = €1000

WEEK 3 03/12 - 09/12

Website Wireframes + Design + Front-End

Wie: Des Duur: 24u Kost: €960

<u>Schetsen + Website Back-End</u>

Wie: Dev Duur: 48u Kost: €1920

<u>Administratie + Joker</u>

Wie: PM Duur: 24u Kost: €960

TOTALE UREN = 96 TOTALE KOST = €3.840

WEEK 4 10/12 – 16/12

Front-End + UX/UI + UX Testing

Wie: Des Duur: 24u Kost: €960

Prototype (hardware, code, testing)

Wie: Dev Duur: 48u Kost: €1920

<u>Administratie + Joker</u>

Wie: PM Duur: 24u Kost: €960

TOTALE UREN = 96 TOTALE KOST = €3.840

WEEK 5 17/12 – 23/12

Branding + Style Guide

Wie: Des Duur: 24u Kost: €960

MLP (hardware, code, testing)

Wie: Dev Duur: 48u Kost: €1920

<u>Administratie + Joker</u>

Wie: PM Duur: 24u Kost: €960

TOTALE UREN = 96 TOTALE KOST = €3.840

WEEK 6 24/12 - 30/12

<u>Fotografie + Storyboarding + Filmen</u>

Wie: Des Duur: 24u Kost: €960

MLP (hardware, code, testing)

Wie: Dev Duur: 48u Kost: €1920

<u>Administratie + Joker</u>

Wie: PM Duur: 24u Kost: €960

TOTALE UREN = 96 TOTALE KOST = €3.840

WEEK 7 31/12 - 06/01

Filmen + Editen

Wie: Des Duur: 24u Kost: €960

Eindproduct (hardware, code, testing)

Wie: Dev Duur: 48u Kost: €1920

<u>Administratie + Joker</u>

Wie: PM Duur: 24u Kost: €960

TOTALE UREN = 96 TOTALE KOST = €3.840

WEEK 8 07/01 - 10/01

UI/UX + UX Testing

Wie: Des Duur: 24u Kost: €960

Eindproduct (hardware, code, testing)

Wie: Dev Duur: 48u Kost: €1920

<u>Administratie + Joker</u>

Wie: PM Duur: 24u Kost: €960

TOTALE UREN = 96 TOTALE KOST = €3.840
